MINTA – Projektütemterv

Name	Start Date	Time Estim…
Generál -		
Beszerzés		
Vizes szerelvények (ÜGYFÉL)	Aug 5	
Burkolatok (ÜGYFÉL)	Aug 10	
IKEA konyhabútor	Aug 5	
Nyílászárók		
Kültéri nyílászárók		
Felmérés, megrendelés	Jul 17	
Szállítás kültéri	Aug 11	
Beépítés kültéri	Sep 2	
Beltéri nyílászárók		
Felmérés, ajánlatkérés	Aug 11	
Szállítás beltéri	Aug 17	
Beépítés beltéri	Nov 5	
Építési terv módosítása		
Belső falak és nyílások		
Nyílások kialakítása	Aug 7	
Gipszkartonozás	Jul 14	
Falak felhúzása	Jul 21	
Bandázsolás, glettelés	Aug 4	
Építőanyag-igény szállítás (áthidalók)	Aug 4	
Nyílások falazása (ellenőrizendő)	Jul 30	
Nyílások finomjavítása	Sep 8	
Elektromos hálózat		
Vésés, kábelezés	Jul 21	
Ellenőrizni a kiállások helyét		
Aljzatok installálása (egyeztetni)	Aug 31	
Bútor, lámpák bekötése	Nov 14	
Villanyóra bővítése		
Burkolás		
Burkolatok megrendelése (egyeztetni)	Aug 4	
Hidegburkolás	Oct 21	
Aljzatkiegyenlítés	Aug 25	
Melegburkolás	Sep 1	
Festés		
Falak javítása (kőműves)	Sep 1	
Csiszolás, glettelés	Sep 15	
Falfestés	Sep 21	
Fűtési rendszer		
Padlófűtés installálása		
Hőszivattyú telepítése	Aug 26	
Műszaki átadás	Sep 1	
Víz- és csatornahálózat		
Meglévő bontása		
Új víz és csatorna kialakítása		
Bekötés, nyomáspróba	Sep 1	
Szerelvényezés	Nov 4	
Egyéb		
Lépcsők		
Beltéri lépcsők installálása	Oct 13	
Kültéri lépcsők kialakítása	Sep 8	
Bejárati oszlop cseréje	Sep 8	
Padlásfeljáró (szállítás alatt)	Aug 25	
Beépítés	Aug 11	
Elszívók telepítése (egyeztetni)		
Wagner Solar (09.11. -		
Gázóra leszerelése	Jul 21	
Klima - kültéri a lefolyóba		
Klima - beltéri csöve?		
Szagelszívo milyen legyen?		
Bútorok		
IKEA konyhabútor beszerelés	Nov 4	
Egyedi bútorok		
Klima		
Végső munkálatok (installálás)		
Klíma-kiállások végső helye	Jul 31	
Villamos terv végleges verzió	Aug 6	
Szerződések		
Ajánlatkérés		
Tervezés		
Add Task		

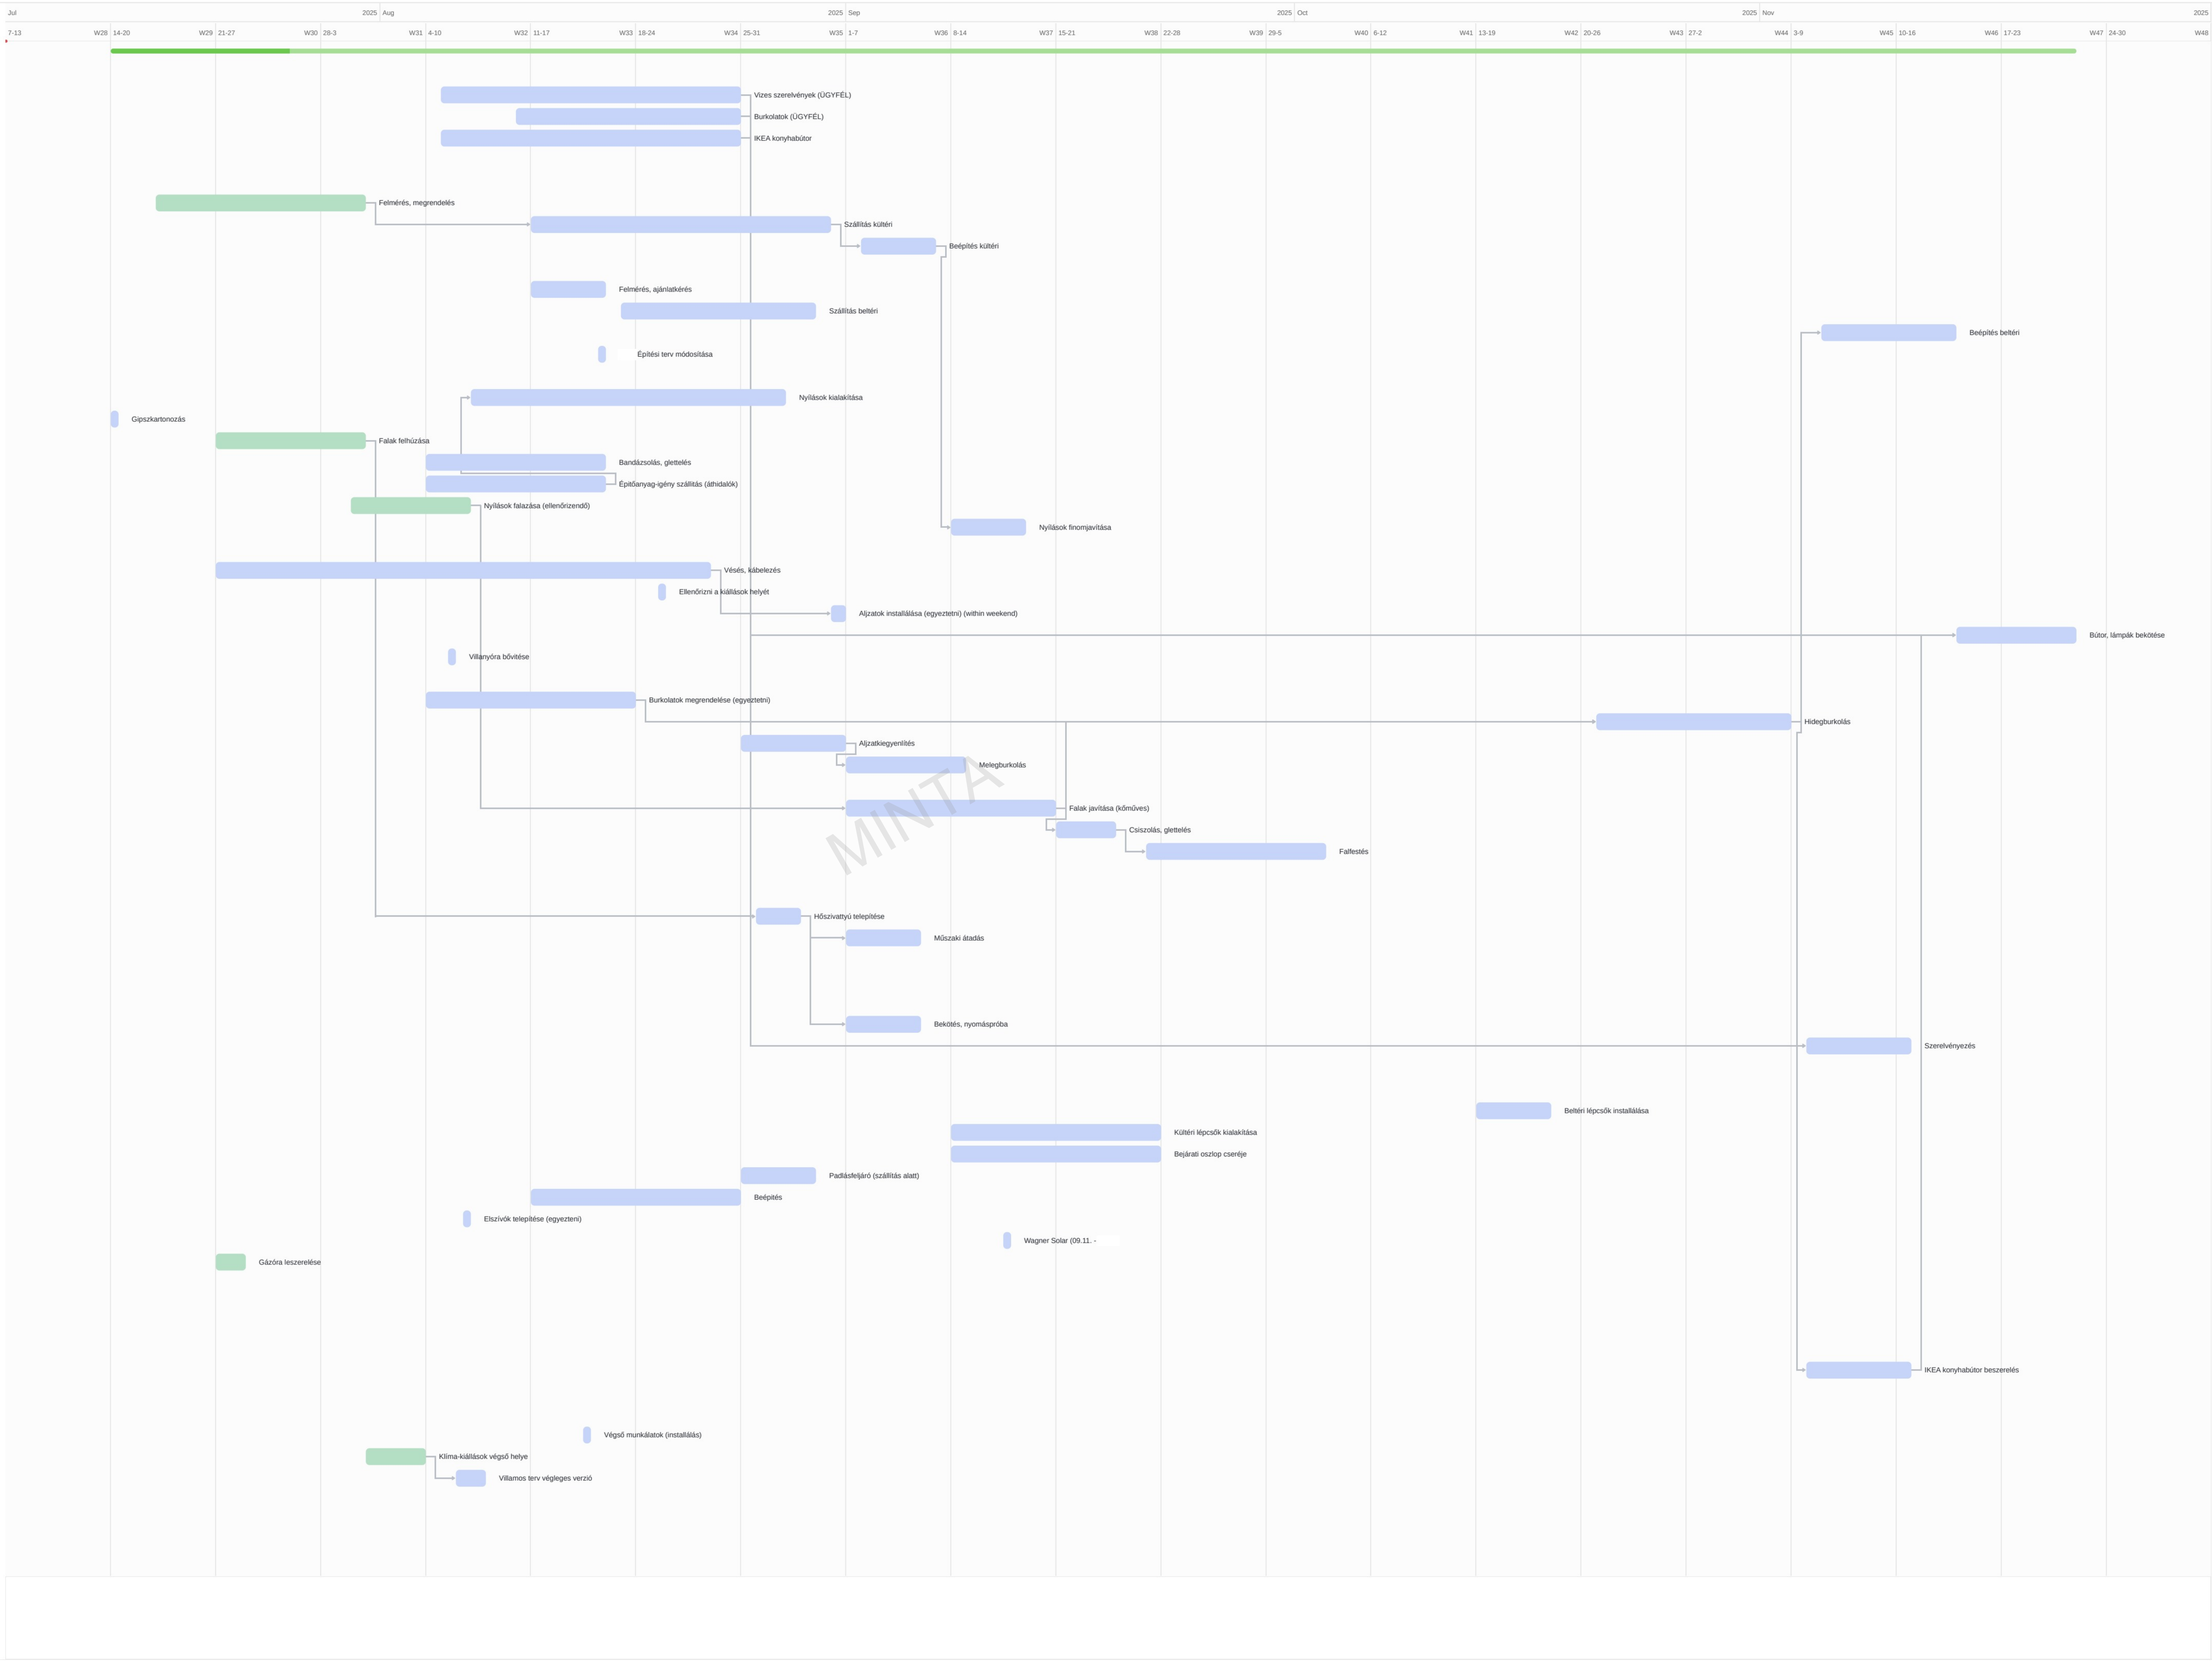

Anonimizált bemutatópéldány. Archív adatok, nem aktuális ajánlat.
